




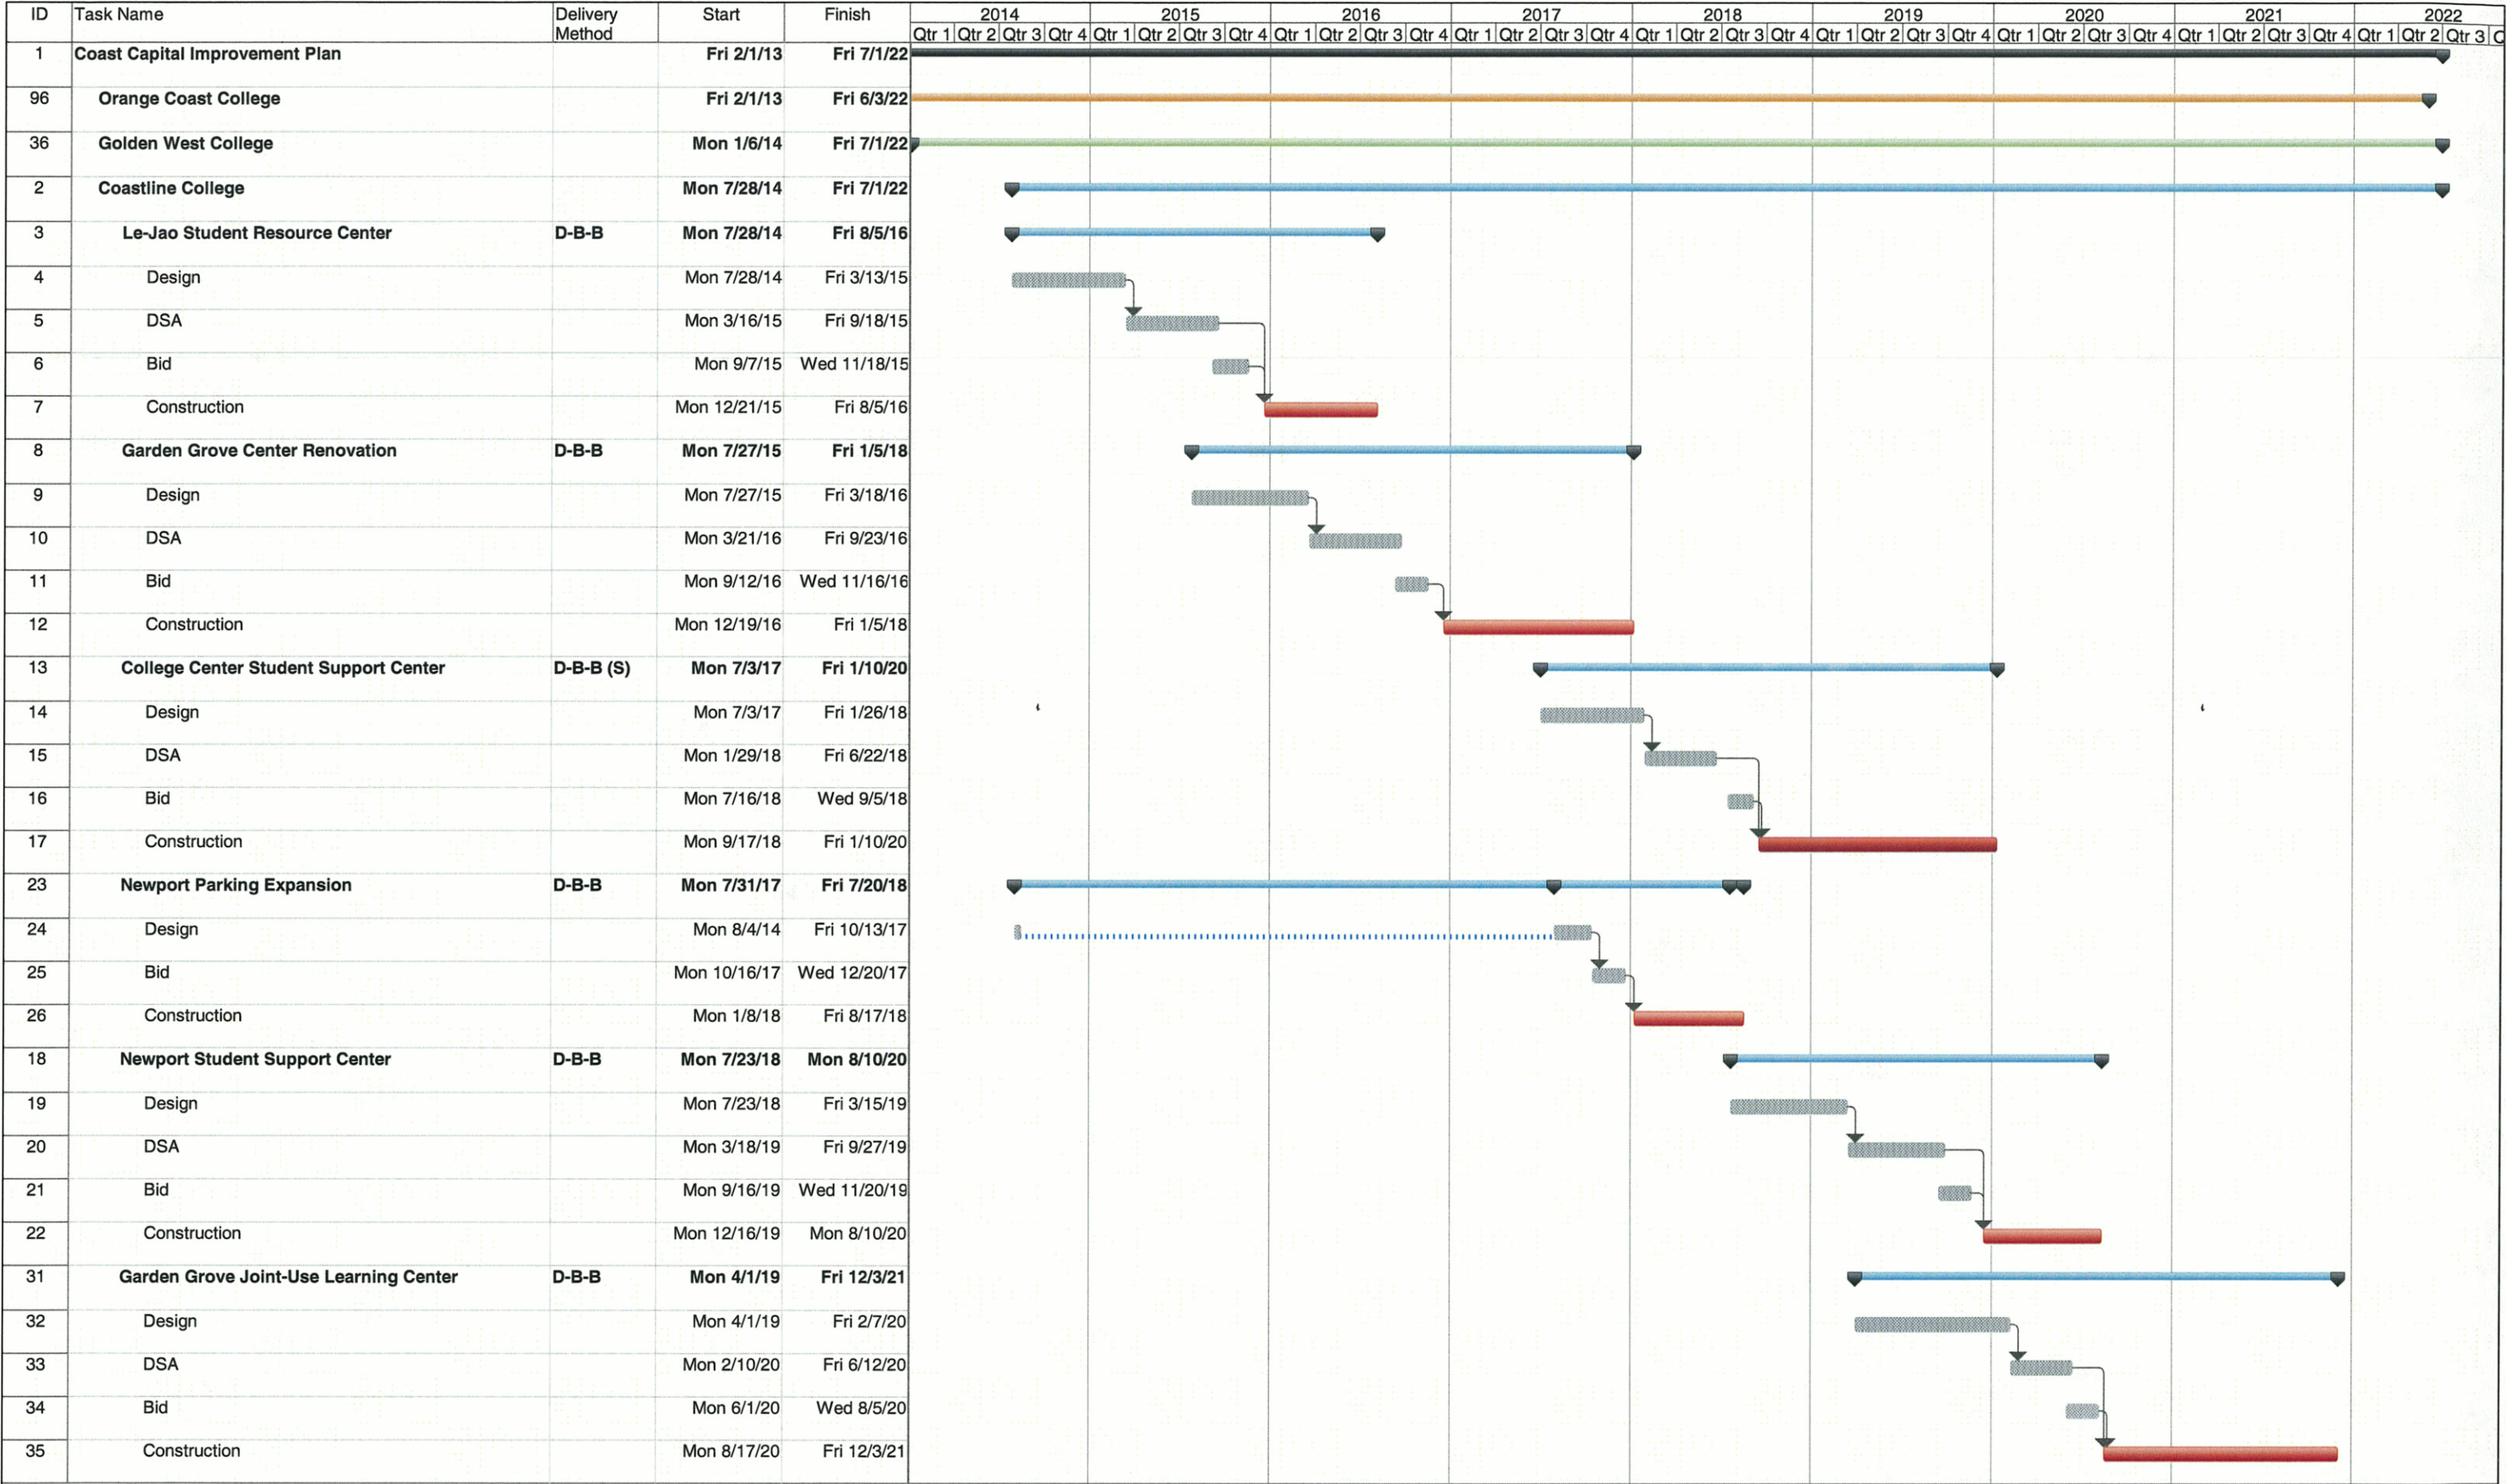

ID	Task Name	Delivery Method	Start	Finish	2014				2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
27	Le-Jao Parking Expansion	D-B-B	Mon 7/19/21	Fri 7/1/22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							



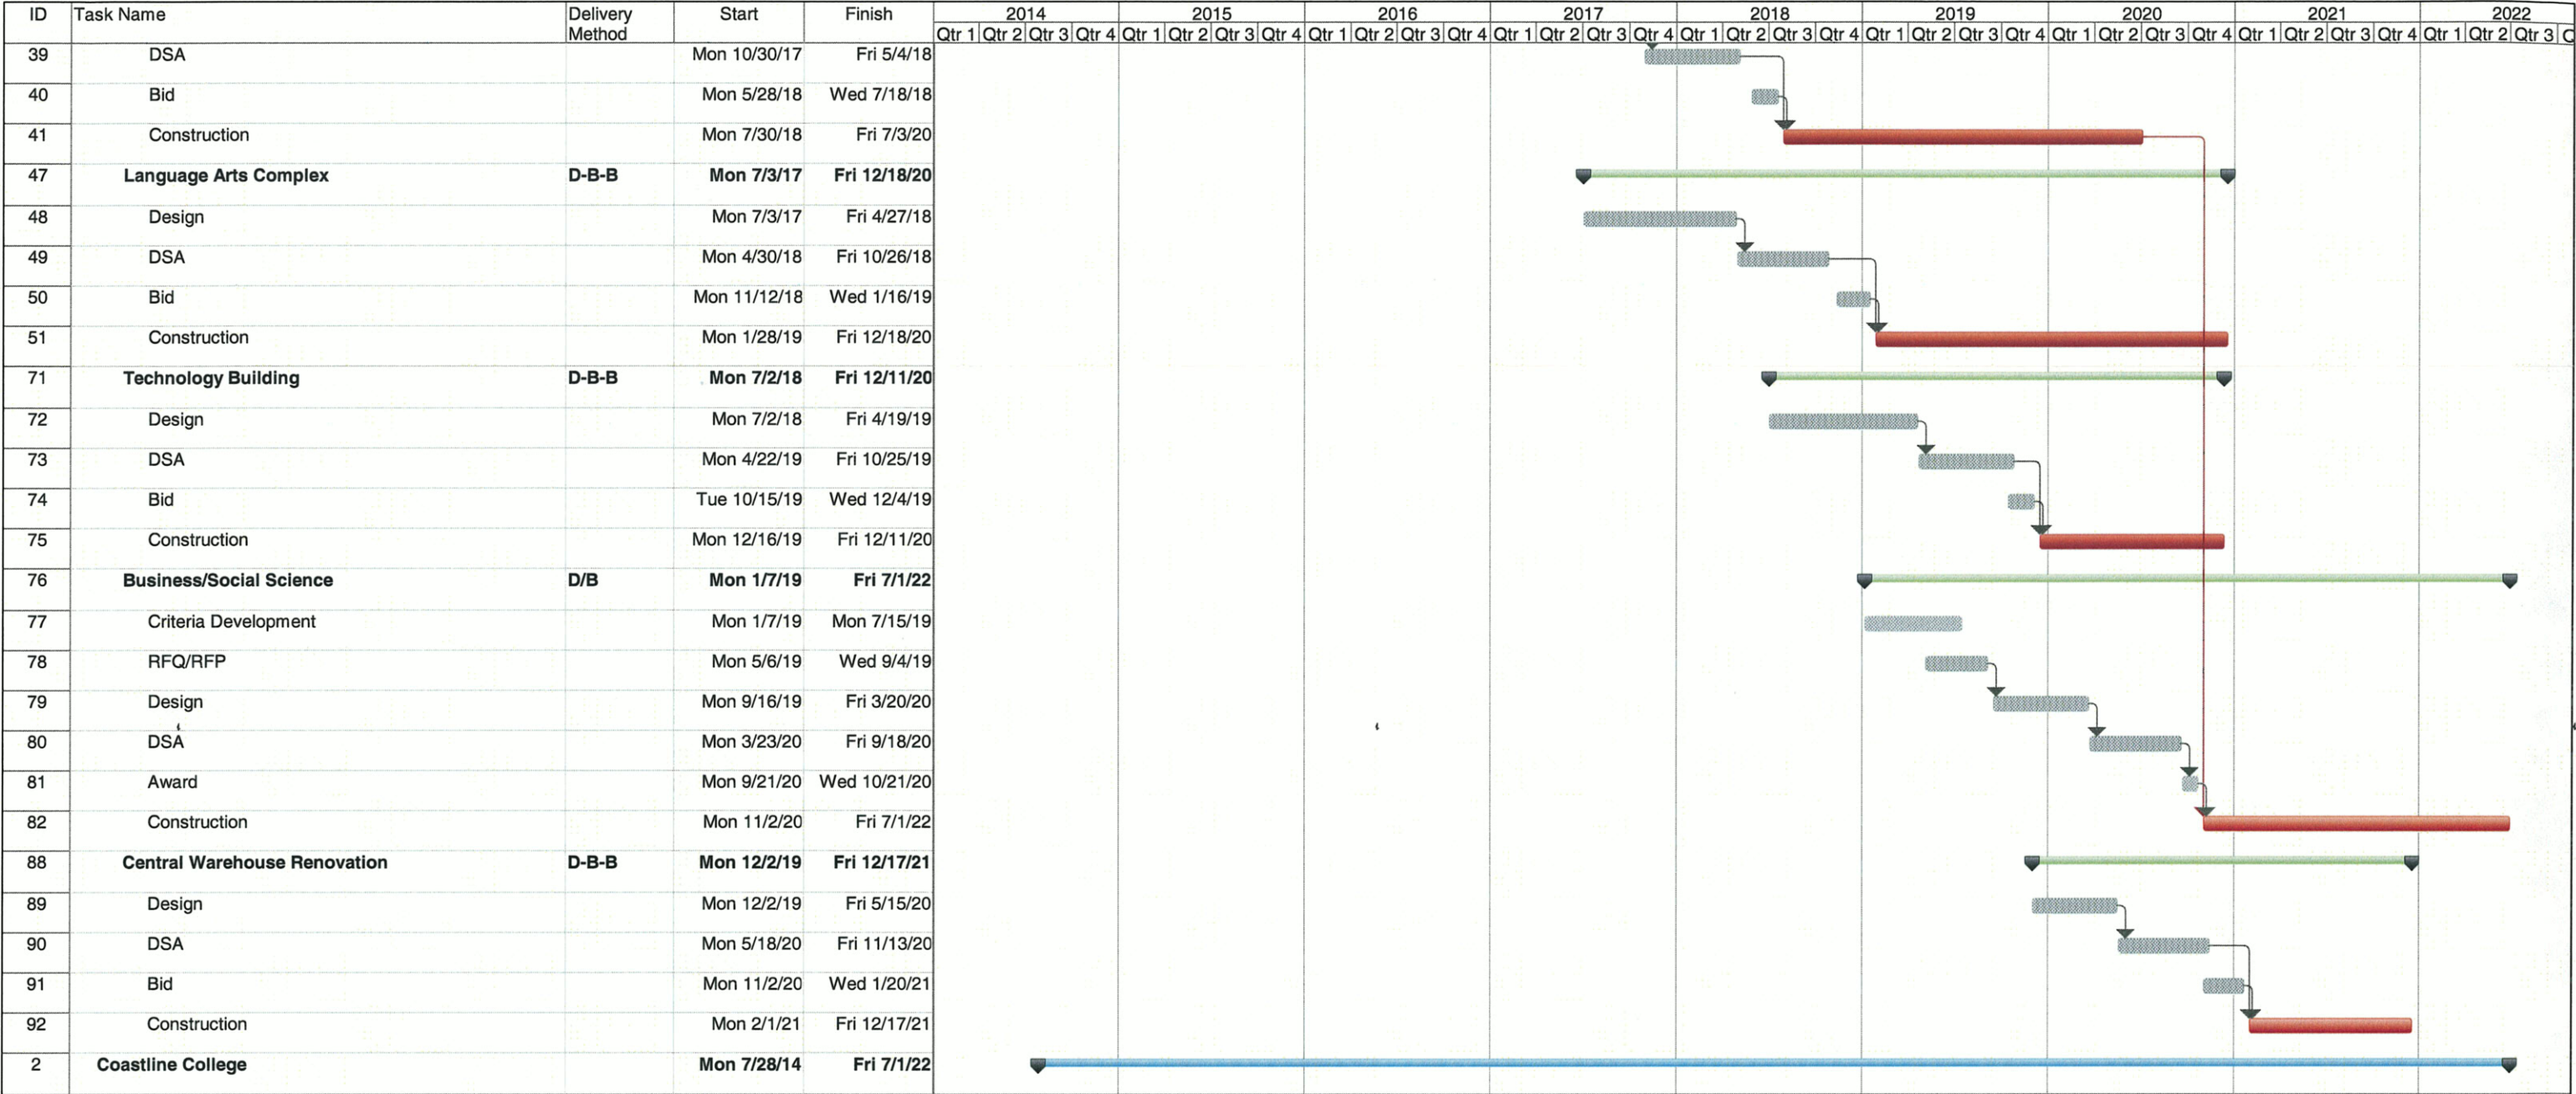

ID	Task Name	Delivery Method	Start	Finish	2014				2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				2022			
					Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4				
1	Coast Capital Improvement Plan		Fri 2/1/13	Fri 7/1/22																																				
96	Orange Coast College		Fri 2/1/13	Fri 6/3/22																																				
99	Recycling Center	D-B-B	Fri 2/1/13	Fri 9/18/15																																				
100	Design		Fri 2/1/13	Fri 1/31/14																																				
101	DSA		Mon 2/3/14	Fri 8/8/14																																				
102	Bid		Tue 7/15/14	Wed 9/3/14																																				
103	Construction		Mon 9/15/14	Fri 9/18/15																																				
104	Planetarium	D-B-B	Fri 2/1/13	Mon 10/3/16																																				
105	Design		Fri 2/1/13	Mon 2/17/14																																				
106	DSA		Mon 2/24/14	Mon 8/25/14																																				
107	Bid		Thu 1/1/15	Fri 5/1/15																																				
108	Construction		Wed 7/1/15	Mon 10/3/16																																				
167	Enterprise/Adams Restrooms	D-B-B	Tue 7/30/13	Fri 11/21/14																																				
168	DSA		Tue 7/30/13	Fri 1/31/14																																				
169	Bid		Mon 2/10/14	Wed 4/16/14																																				
170	Construction		Mon 5/19/14	Fri 11/21/14																																				
97	IDC Phase I (Business, Math, Computing)	D-B-B	Tue 8/27/13	Tue 6/30/15																																				
98	Construction		Tue 8/27/13	Tue 6/30/15																																				
109	Parking Structure	D/B	Mon 9/2/13	Fri 7/1/16																																				
110	Criteria Development		Mon 9/2/13	Mon 3/31/14																																				
111	RFQ/RFP		Tue 4/1/14	Wed 8/6/14																																				
112	Design		Thu 8/7/14	Fri 1/9/15																																				
113	DSA		Mon 1/12/15	Fri 7/17/15																																				
114	Award		Mon 7/20/15	Wed 8/5/15																																				
115	Construction		Mon 8/10/15	Fri 7/1/16																																				
141	Administration/Student Support Center	D/B	Thu 1/16/14	Tue 12/11/18																																				
142	Criteria Development		Thu 1/16/14	Fri 12/12/14																																				
143	RFQ/RFP		Mon 10/27/14	Wed 4/1/15																																				
144	Design		Mon 4/13/15	Fri 2/12/16																																				
145	DSA		Mon 2/22/16	Fri 8/26/16																																				
146	Award		Mon 8/29/16	Wed 9/21/16																																				
147	Construction		Mon 9/26/16	Tue 12/11/18																																				
148	Student Union	D/B	Thu 1/16/14	Tue 12/11/18																																				
149	Criteria Development		Thu 1/16/14	Fri 12/12/14																																				
150	RFQ/RFP		Mon 10/27/14	Wed 4/1/15																																				
151	Design		Mon 4/13/15	Fri 2/12/16																																				
152	DSA		Mon 2/22/16	Fri 8/26/16																																				
153	Award		Mon 8/29/16	Wed 9/21/16																																				
154	Construction		Mon 9/26/16	Tue 12/11/18																																				
171	Solar Photovoltaic	D/B	Mon 2/17/14	Fri 4/10/15																																				
172	RFQ/RFP		Mon 2/17/14	Wed 4/23/14																																				
173	Design		Mon 5/5/14	Mon 6/16/14																																				
174	DSA		Thu 6/19/14	Fri 12/19/14																																				
175	Construction		Mon 12/22/14	Fri 4/10/15																																				
136	Adaptive PE, Gym, & Pool	D-B-B	Mon 3/17/14	Fri 1/6/17																																				
137	Design		Mon 3/17/14	Fri 11/21/14																																				
138	DSA		Mon 11/24/14	Fri 5/29/15																																				
139	Bid		Mon 5/11/15	Wed 7/1/15																																				
140	Construction		Mon 7/13/15	Fri 1/6/17																																				

Page 1

